Руководитель
регионального проекта —
Божко Юрий Николаевич

_____
(подпись)

ОДОБРЕН

_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(GA-42) Сохранение лесов (Липецкая область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответсвующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	48.9	49.2	66.76	66.77	66.78	57.5	116,14%	Показатель является годовым

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета[2]

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 64 737,52 тыс. руб

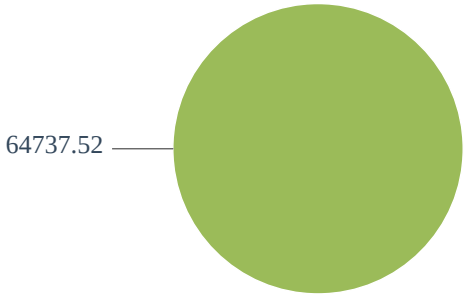

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

[2] При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		*(01) Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий*	33 278,92	33 278,92	33 278,92	33 278,92	33 278,92	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	33 278,92	33 278,92	33 278,92	33 278,92	33 278,92	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	33 278,92	33 278,92	33 278,92	33 278,92	33 278,92	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		*(20) Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению*	569,10	569,10	569,10	569,10	569,10	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	569,10	569,10	569,10	569,10	569,10	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	569,10	569,10	569,10	569,10	569,10	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		*(21) Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.*	16 709,30	16 709,30	16 709,30	16 709,30	16 709,30	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16 709,30	16 709,30	16 709,30	16 709,30	16 709,30	100,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	16 709,30	16 709,30	16 709,30	16 709,30	16 709,30	100,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		*(22) Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров*	14 180,20	14 180,20	14 180,20	14 180,20	14 180,20	100,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 180,20	14 180,20	14 180,20	14 180,20	14 180,20	100,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 180,20	14 180,20	14 180,20	14 180,20	14 180,20	100,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		*(23) Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			64 737,52	64 737,52	64 737,52	64 737,52	64 737,52	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			64 737,52	64 737,52	64 737,52	64 737,52	64 737,52	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			64 737,52	64 737,52	64 737,52	64 737,52	64 737,52	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий Значение: 0,2000 Дата: 31.12.2021	3
2		Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021	1
3		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. Значение: 0,2100 Дата: 31.12.2021	3
4		Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021	1
5		Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Значение: 2,1300 Дата: 31.12.2021	2

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			*Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий Значение: 0.2, на дату 31.12.2021*	31.12.2021	31.12.2021	Есипов Н. В.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.2 из 0.2.
1.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.01.2021	30.12.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзаданий для ГАУ на 2021 год" Приказ от 30.12.2020г. №261, приложен файл. 2. "Об утверждении нормативных затрат для ГАУ на 2021 год" Приказ от 30.12.2020г. №262, приложен файл. 3. "Об утверждении финансового обеспечения госзаданий для ГАУ на 2021 год" Приказ от 30.12.2020г. №263, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.1.1	РРП		Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного задания	31.01.2021	30.12.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Таблицы с объемами по лесоразведению на 2021 год" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Таблица с объемами по лесоразведению на 2021 год - 2" Иное от г. №, приложен файл. 3. "Нормативы затрат на 2021 год (ОБ)" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	31.01.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении нормативных затрат на выполнение

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							работ по охране, защите, воспроизводству лесов для государственных автономных учреждений" Приказ Управление лесного хозяйства Липецкой области от 30.12.2019г. №341, приложен файл. 2. "Об утверждении финансового обеспечения государственных заданий на 2020 год для государственных автономных учреждений" Приказ Управление лесного хозяйства Липецкой области от 30.12.2019г. №342, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
1.2.1	РРП		Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания	31.01.2020	31.01.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственных заданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для государственных автономных учреждений" Приказ Управление лесного хозяйства Липецкой области от 30.12.2019г. №340, приложен файл.
1.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты выполненных работ за счет средств областного бюджета (25 445 972,65)" Иное от г. №, приложен файл. 2. "2-Акты выполненных работ за счет средств областного бюджета (4 189 737,15)" Иное от г. №, приложен файл. 3. "3-Акты выполненных работ за счет средств областного бюджета (1 882 558,57)" Иное от г. №, приложен файл. 4. "4-Акты выполненных работ за счет средств областного бюджета (1 760 655,72)" Иное от г. №, приложен файл. 5. "Накопительная по актам выполненных работ (ОБ)"

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.3.1	РРП		Проведение приемки работ по лесоразведению	31.10.2020	25.06.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная ведомость защитных лесных насаждений по породному составу" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 25.06.2020г. №б/н, приложен файл.
2.			*Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Значение: 50, на дату 31.12.2021*	31.12.2021	31.12.2021	Есипов Н. В.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Справка по исполнению лимитов на 31.12.2020г" Иное от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 50 из 50.
2.1.	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	15.06.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Товарная накладная" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 12.03.2020г. №18, приложен файл. 2. "Акт приемки-передачи техники" Акт приема-передачи Управление лесного хозяйства Липецкой области от 16.03.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Товарная накладная" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 12.03.2020г. №19, приложен файл. 4. "Акт сдачи-приемки техники" Акт приема-передачи Управление лесного хозяйства Липецкой области от 16.03.2020г. №б/н, приложен файл. 5. "Товарная накладная" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 12.03.2020г. №20, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							6. "Товарная накладная" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 12.03.2020г. №21, приложен файл. 7. "Акт сдачи-приемки техники" Акт приема-передачи Управление лесного хозяйства Липецкой области от 16.03.2020г. №б/н, приложен файл.
2.1.1	РРП		Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.04.2020	01.04.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Техническое задание" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 10.02.2020г. №б/н, приложен файл.
2.1.2	РРП		Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы. лесопосадочные машины. бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	31.12.2020	16.03.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки техники ГАУ "Елецкий лесхоз"" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Акт сдачи-приемки техники ГАУ "Задонский лесхоз"" Иное от г. №, приложен файл. 3. "Акт сдачи-приемки техники ГАУ"Донской лесхоз"" Иное от г. №, приложен файл. 4. "Товарная накладная, счет-фактура ГАУ "Донской лесхоз"" Иное от г. №, приложен файл. 5. "Счет-фактура ГАУ "Елецкий лесхоз"" Иное от г. №, приложен файл. 6. "Товарна накладная ГАУ "Елецкий лесхоз"" Иное от г. №, приложен файл. 7. "Товарная накладная, счет-фактура ГАУ "Задонский лесхоз"" Иное от г. №, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
3.			*Увеличена площадь лесовосстановления, повышено*	31.12.2021	31.12.2021	Есипов Н. В.	Информация по значению результата: В

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. Значение: 0.21, на дату 31.12.2021				работе.Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка к материалам инвентаризации лесных культур в лесном фонде за 2020 год" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствуют отклонения. Предоставлена информация : 0.21 из 0.21.
3.1.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.01.2021	30.12.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзаданий для ГАУ на 2021 год" Приказ от 30.12.2020г. №261, приложен файл. 2. "Об утверждении нормативных затрат для ГАУ на 2021 год" Приказ от 30.12.2020г. №262, приложен файл. 3. "Об утверждении финансового обеспечения госзаданий для ГАУ на 2021 год" Приказ от 30.12.2020г. №263, приложен файл. Отсутствие отклонений
3.1.1	РРП		Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов	31.01.2021	30.12.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Объемы по лесоразведению и лесовосстановлению (Форма из защиты бюджетных проектировок 3.4.1.)" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Объемы по лесоразведению и лесовосстановлению на 2021 год" Иное от г. №, приложен файл. 3. "Нормативы затрат на 2021 год (ФБ)" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
3.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.01.2020	31.01.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							государственных автономных учреждений" Приказ Управление лесного хозяйства Липецкой области от 30.12.2019г. №341, приложен файл. 2. "Об утверждении финансового обеспечения государственных заданий на 2020 год для государственных автономных учреждений" Приказ Управление лесного хозяйства Липецкой области от 30.12.2019г. №342, приложен файл.
3.2.1	РРП		Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов	31.01.2020	31.01.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственных заданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для государственных автономных учреждений" Приказ Управление лесного хозяйства Липецкой области от 30.12.2019г. №340, приложен файл.
3.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "1-Акты выполненных работ за счет средств федерального бюджета (15 126 689,80)" Иное от г. №, приложен файл. 2. "2-Акты выполненных работ за счет средств федерального бюджета (992 010,99)" Иное от г. №, приложен файл. 3. "3- Акты выполненных работ за счет средств федерального бюджета (174 268,13)" Иное от г. №, приложен файл. 4. "4- Акты выполненных работ за счет средств федерального бюджета (246 921,72)" Иное от г. №, приложен файл. 5. "5-Акты выполненных работ за счет средств

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							федерального бюджета (169 409,36)" Иное от г. №, приложен файл. 6. "Накопительная по актам выполненных работ (ФБ)" Иное от г. №, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
3.3.1	РРП		Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	31.10.2020	30.06.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка по итогам приемки весенних лесокультурных работ" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 25.06.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Сводная ведомость лесоразведения и лесовосстановления в лесном фонде" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 29.05.2020г. № б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
4.			*Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 87, на дату 31.12.2021*	31.12.2021	31.12.2021	Есипов Н. В.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Справка по исполнению лимитов на 31.12.2020г" Иное от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 87 из 87.
4.1.	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	15.06.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Товарная накладная" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 11.03.2020г. №ЭК-0000062, приложен файл. 2. "Приемо-сдаточный акт" Акт поставки оборудования Управление лесного хозяйства Липецкой области от

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							13.03.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Универсальный передаточный документ" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 29.05.2020г. №К000040654, приложен файл. 4. "Акт сдачи-приемки техники" Акт поставки оборудования Управление лесного хозяйства Липецкой области от 29.05.2020г. №б/н, приложен файл. 5. "Универсальный передаточный документ" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 29.05.2020г. №ЦБ-4, приложен файл. 6. "Акт сдачи-приемки техники" Акт поставки оборудования Управление лесного хозяйства Липецкой области от 30.05.2020г. №б/н, приложен файл. 7. "Универсальный передаточный документ" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 29.05.2020г. №1249, приложен файл. 8. "Акт приема-передачи товара" Акт поставки оборудования Управление лесного хозяйства Липецкой области от 08.06.2020г. №58, приложен файл. 9. "Товарная накладная" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 15.06.2020г. №679, приложен файл. 10. "Акт приема-передачи товара" Акт поставки оборудования Управление лесного хозяйства Липецкой области от 15.06.2020г. №б/н, приложен файл.
4.1.1	РРП		Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны)	31.12.2020	15.06.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приемки-передачи КАМАЗ" Акт приема-передачи от г. №, приложен файл. 2. "Счет-фактура КАМАЗ" Иное от г. №, приложен файл. 3. "Товарная накладная Квадрокоптер" Иное от г. №, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							4. "Акт приемки-передачи квадрокоптера" Акт приема-передачи от г. №, приложен файл. 5. "Акт приемки-передачи трактора" Акт приема-передачи от г. №, приложен файл. 6. "Счет-фактура Трактор" Иное от г. №, приложен файл. 7. "Акт приемки-передачи пожарного оборудования" Акт приема-передачи от г. №, приложен файл. 8. "Счет-фактура Бензопила" Иное от г. №, приложен файл. 9. "Приемо-сдаточный акт автобус ПАЗ" Иное от г. №, приложен файл. 10. "Накладная автобус ПАЗ" Иное от г. №, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
4.1.2	РРП		Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	01.04.2020	01.04.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Техническое задание" Техническое задание Управление лесного хозяйства Липецкой области от 10.02.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Техничекое задание" Техническое задание Управление лесного хозяйства Липецкой области от 10.02.2020г. № б/н, приложен файл. 3. "Техническое задание" Техническое задание Управление лесного хозяйства Липецкой области от 10.02.2020г. №б/н, приложен файл.
5.			*Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Значение: 2.13, на дату 31.12.2021*	31.12.2021	31.12.2021	Есипов Н. В.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка по ожидаемому урожаю и заготовке семян" Иное от г. №, приложен файл. Отклонения отсутствуют.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Предоставлена информация : 2.13 из 2.13.
5.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.10.2020	01.10.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная ведомость учета семян" Иное Управление лесного хозяйства от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
5.1.1	РРП		Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.10.2020	01.10.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная ведомость учета семян" Иное Управление лесного хозяйства от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Ведомость учета урожая семян в разрезе лесничеств" Иное от 01.09.2020г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
5.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка по заготовке семян" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
5.2.1	РРП		Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	31.12.2020	31.12.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт "Ожидаемая обеспеченность посевным материалом весенних лесокультурных работ"" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян " Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

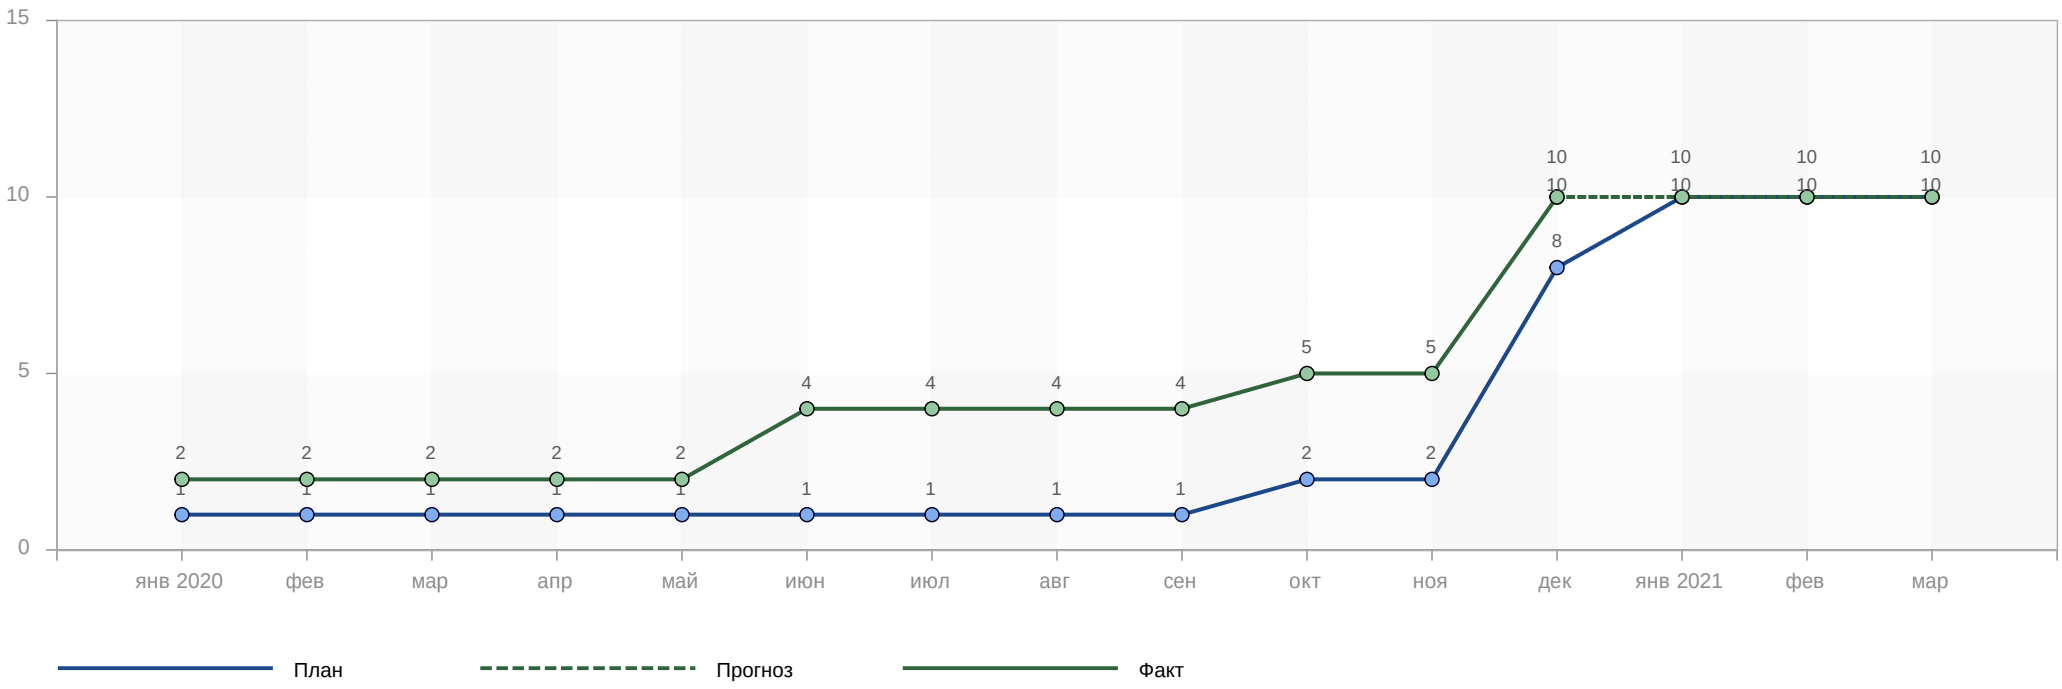

Рис. 1. *"(GA-42) Сохранение лесов (Липецкая область)"*

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

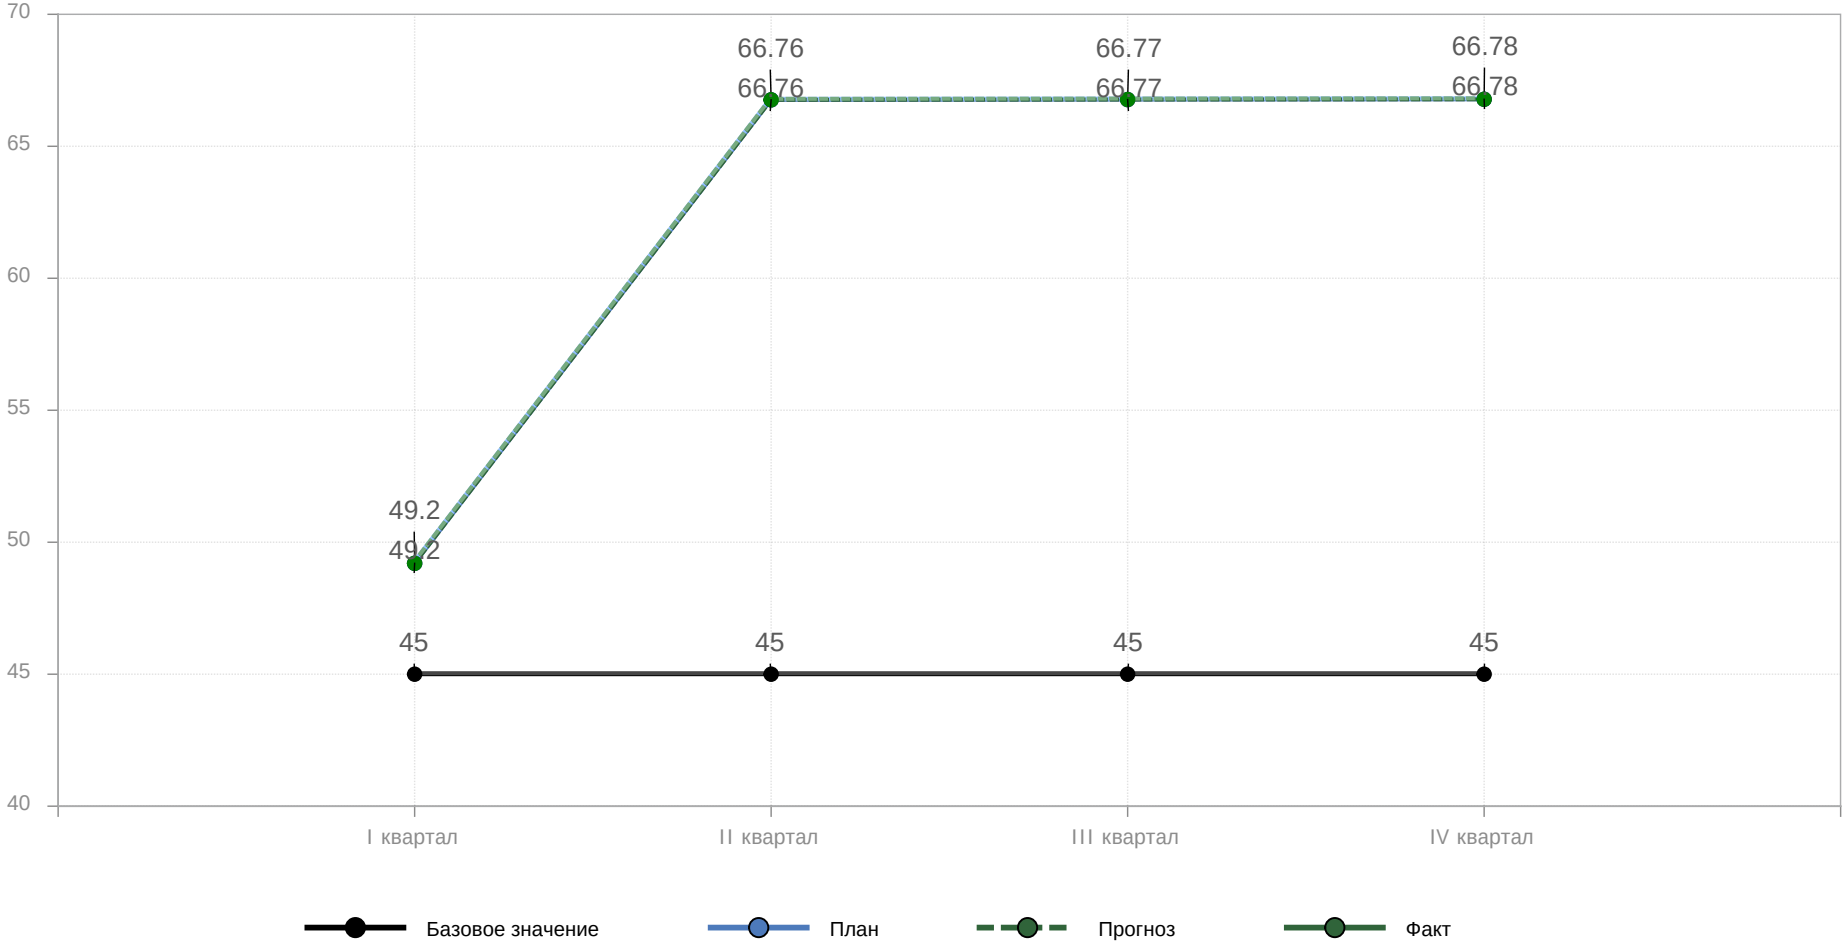

Рис. 1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

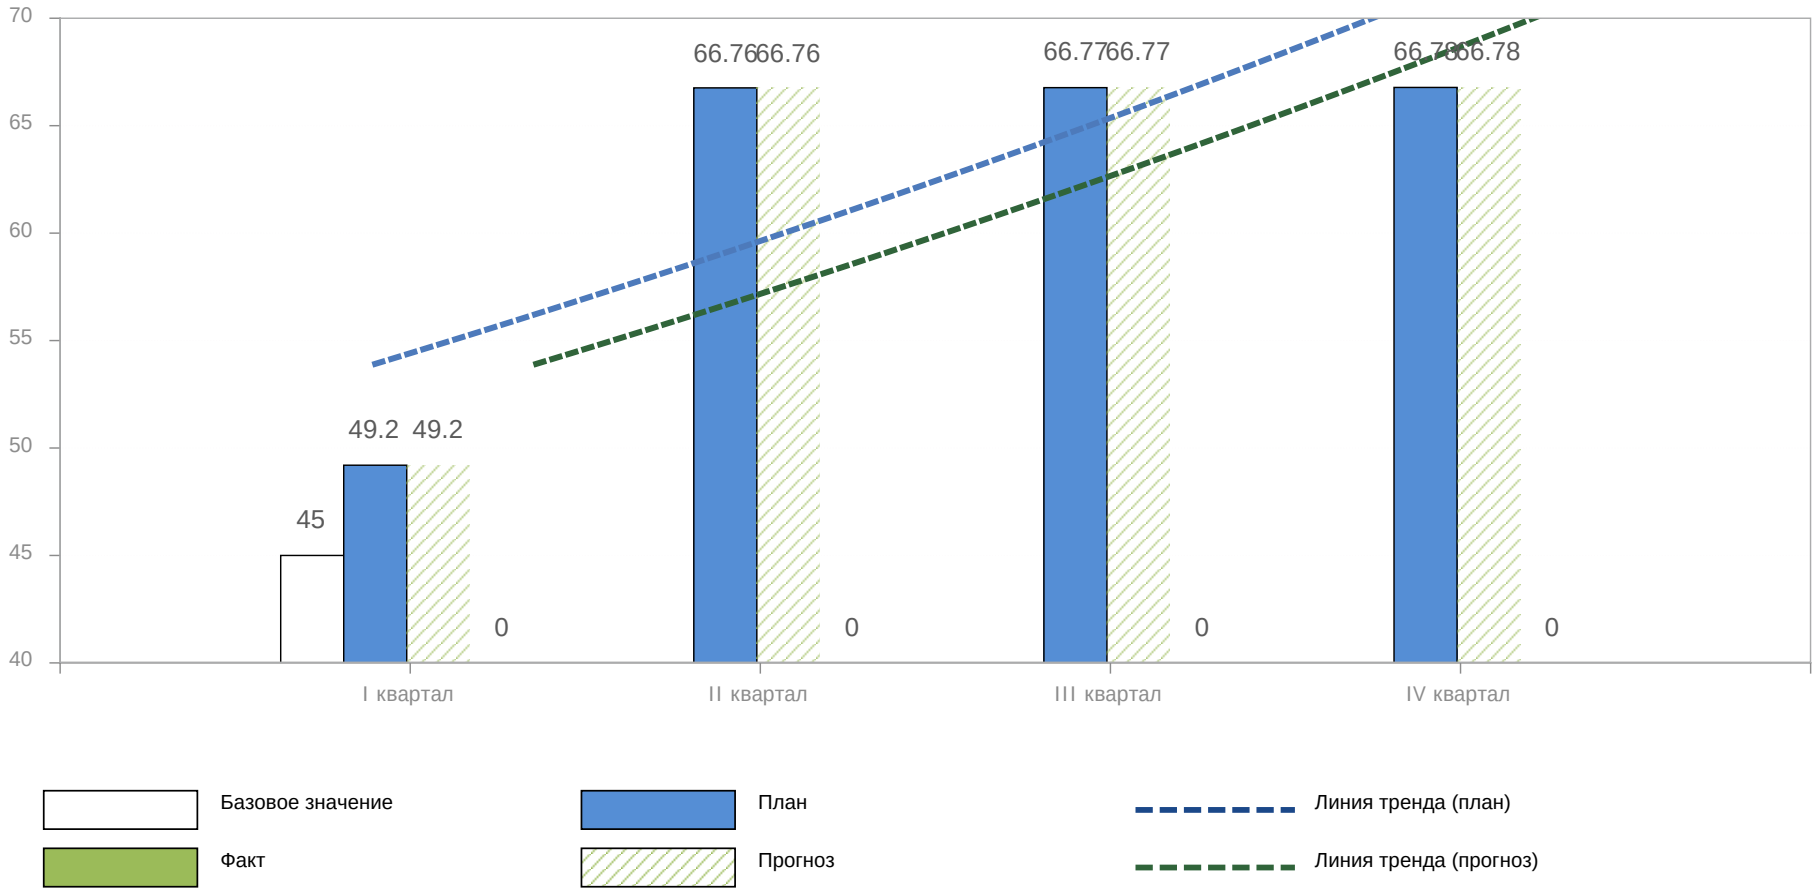

Рис. 2. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
